'"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. GENERAL CORDOVA EN EL TRAMO JR. BARTOLOME HERRERA HASTA EL JR JOSÉ OLAYA DEL DISTRITO DE COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2709965"

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración
1	**1**	**OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD**	**60 días**
2	**1.1**	**OBRAS PROVISIONALES**	**36 días**
3	1.1.1	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRAS 4.80M X 3.60 M	1 día
4	1.1.2	ALMACEN Y VESTUARIO Y OFICINA PROVISIONAL	2 días
5	1.1.3	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA OBRA	2 días
6	1.1.4	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6 días
7	**1.2**	**SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA**	**60 días**
8	1.2.1	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	7 días
9	1.2.2	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	7 días
10	1.2.3	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	7 días
11	1.2.4	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	60 días
12	1.2.5	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	7 días
13	**1.3**	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**16 días**
14	**1.3.1**	**DEMOLICIONES**	**16 días**
15	1.3.1.1	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO E =0.10 m	9 días
16	1.3.1.2	DEMOLICION DE RAMPA DE CONCRETO E=10 CM	9 días
17	1.3.1.3	DEMOLICION DE PISO DE MAYOLICA	9 días
18	1.3.1.4	DEMOLICION DE SARDINEL PERALTADO	1 día
19	1.3.1.5	DEMOLICIÓN DE SARDINEL SUMERGIDO	4 días
20	1.3.1.6	CORTE DE PAVIMENTO EXISTENTE	1 día
21	1.3.1.7	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE	9 días
22	1.3.1.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	1 día
23	**1.3.2**	**TRAZO Y REPLANTEO**	**6 días**
24	1.3.2.1	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN TERRENO NORMAL	6 días
25	**2**	**VEREDA DE CONCRETO**	**30 días**
26	**2.1**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**17 días**
27	2.1.1	CORTE EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA	1 día
28	2.1.2	PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	7 días
29	2.1.3	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO	1 día
30	2.1.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	1 día
31	2.1.5	AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO	7 días
32	**2.2**	**OBRAS DE CONCRETO**	**13 días**
33	2.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS DE CONCRETO	6 días
34	2.2.2	VEREDA DE CONCRETO FC= 175 KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO)	7 días
35	2.2.3	CONCRETO f'c = 175 kg/cm² para UÑas en Veredas	2 días
36	2.2.4	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	4 días
37	2.2.5	JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-VEREDAS	1 día
38	2.2.6	BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y RAMPAS	7 días
39	**2.3**	**NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE**	**5 días**
40	2.3.1	NIVELACIÓN DE CAJAS DE AGUA	5 días
41	2.3.2	NIVELACIÓN DE CAJAS DE DESAGÜE	3 días
42	**3**	**MARTILLOS DE CONCRETO**	**20 días**
43	**3.1**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**11 días**
44	3.1.1	CORTE EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA	1 día
45	3.1.2	PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	4 días
46	3.1.3	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO	1 día
47	3.1.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	1 día
48	3.1.5	AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO	4 días
49	**3.2**	**OBRAS DE CONCRETO**	**9 días**
50	3.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MARTILLOS DE CONCRETO	4 días
51	3.2.2	MARTILLO DE CONCRETO FC= 175 KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO)	4 días
52	3.2.3	CONCRETO F'C = 175 kg/cm² ´PARA UÑAS EN MARTILLOS	1 día
53	3.2.4	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	2 días
54	3.2.5	BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y RAMPAS	4 días
55	**4**	**BERMAS DE CONCRETO**	**12 días**
56	**4.1**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**7 días**
57	4.1.1	CORTE EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA	1 día
58	4.1.2	PERFILADO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL	2 días
59	4.1.3	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO, C/ EQUIPO	1 día
60	4.1.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	1 día
61	4.1.5	AFIRMADO DE E=10CM, NIVELADO Y COMPACTADO	2 días
62	**4.2**	**OBRAS DE CONCRETO**	**5 días**
63	4.2.1	BERMA DE CONCRETO FC= 175 KG /CM2 (ACAB. SEMI PULIDO)	2 días
64	4.2.2	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	1 día
65	4.2.3	BRUÑAS DE 1CM EN VEREDAS Y RAMPAS	2 días
66	**5**	**SARDINELES**	**33 días**
67	**5.1**	**SARDINEL PERALTADO PARA JARDINERAS H=0.60M**	**20 días**
68	**5.1.1**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**4 días**
69	5.1.1.1	CORTE DE TERRENO MANUAL	2 días
70	5.1.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA SARDINELES	1 día
71	5.1.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	1 día
72	**5.1.2**	**OBRAS DE CONCRETO ARMADO**	**16 días**
73	5.1.2.1	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm², GRADO 60	3 días
74	5.1.2.2	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL PERALTADO	8 días
75	5.1.2.3	CONCRETO F'C=210KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA JARDINERA H=0.60M	2 días
76	5.1.2.4	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	1 día
77	5.1.2.5	JUNTA DE DILATACIÓN ASFALTO - ARENA 1:3, E=1"-SARDINELES	1 día
78	5.1.2.6	PINTURA DE SARDINEL	1 día
79	**5.2**	**SARDINEL SUMERGIDO PARA CONFINAMIENTO DE PISTA H=0.40M**	**33 días**
80	**5.2.1**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**7 días**
81	5.2.1.1	CORTE DE TERRENO MANUAL	5 días
82	5.2.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO PARA SARDINELES	1 día
83	5.2.1.3	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	1 día
84	**5.2.2**	**OBRAS DE CONCRETO SIMPLE**	**14 días**
85	5.2.2.1	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO	7 días
86	5.2.2.2	CONCRETO F'C=175KM/CM2 CON PREPARACION MANUAL PARA SARDINEL SUMERGIDO H=0.40M	4 días
87	5.2.2.3	CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO	3 días
88	**6**	**PAVIMENTO FLEXIBLE**	**31 días**
89	**6.1**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**6 días**
90	6.1.1	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/MAQUINARIA	3 días
91	6.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	3 días
92	**6.2**	**PAVIMENTACION**	**17 días**
93	6.2.1	CONFORMACION DE SUBRASANTE CON EQUIPO PESADO	2 días
94	6.2.2	SUB BASE GRANULAR E=0.10 m CON EQUIPO PESADO	2 días
95	6.2.3	BASE GRANULAR E=0.20 m CON EQUIPO PESADO	7 días
96	6.2.4	IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA	2 días
97	6.2.5	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO	4 días
98	**6.3**	**SEÑALIZACIÓN**	**8 días**
99	6.3.1	PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.15 M	5 días
100	6.3.2	PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.15 M	5 días
101	6.3.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL	3 días
102	**6.4**	**NIVELACIÓN DE BUZONES DE DESAGÜE**	**2 días**
103	6.4.1	NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	2 días
104	**7**	**PAISAJISMO**	**5 días**
105	**7.1**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**3 días**
106	7.1.1	CORTE DE TERRENO MANUAL	2 días
107	7.1.2	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=10KM)	1 día
108	**7.2**	**JARDINERÍA**	**2 días**
109	7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA	1 día
110	7.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO	1 día
111	**8**	**ACARREO DE MATERIALES**	**57 días**
112	8.1	ACARREO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES O RELLENOS PARA SER ELIMINADO	30 días
113	**9**	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**59 días**
114	9.1	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA	7 días
115	9.2	RIEGO DURANTE LA EJECUCION	30 días
116	**10**	**VARIOS**	**3 días**
117	10.1	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	1 día
118	10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDESTAL CON PLACA RECORDATORIA DE LA OBRA	2 días

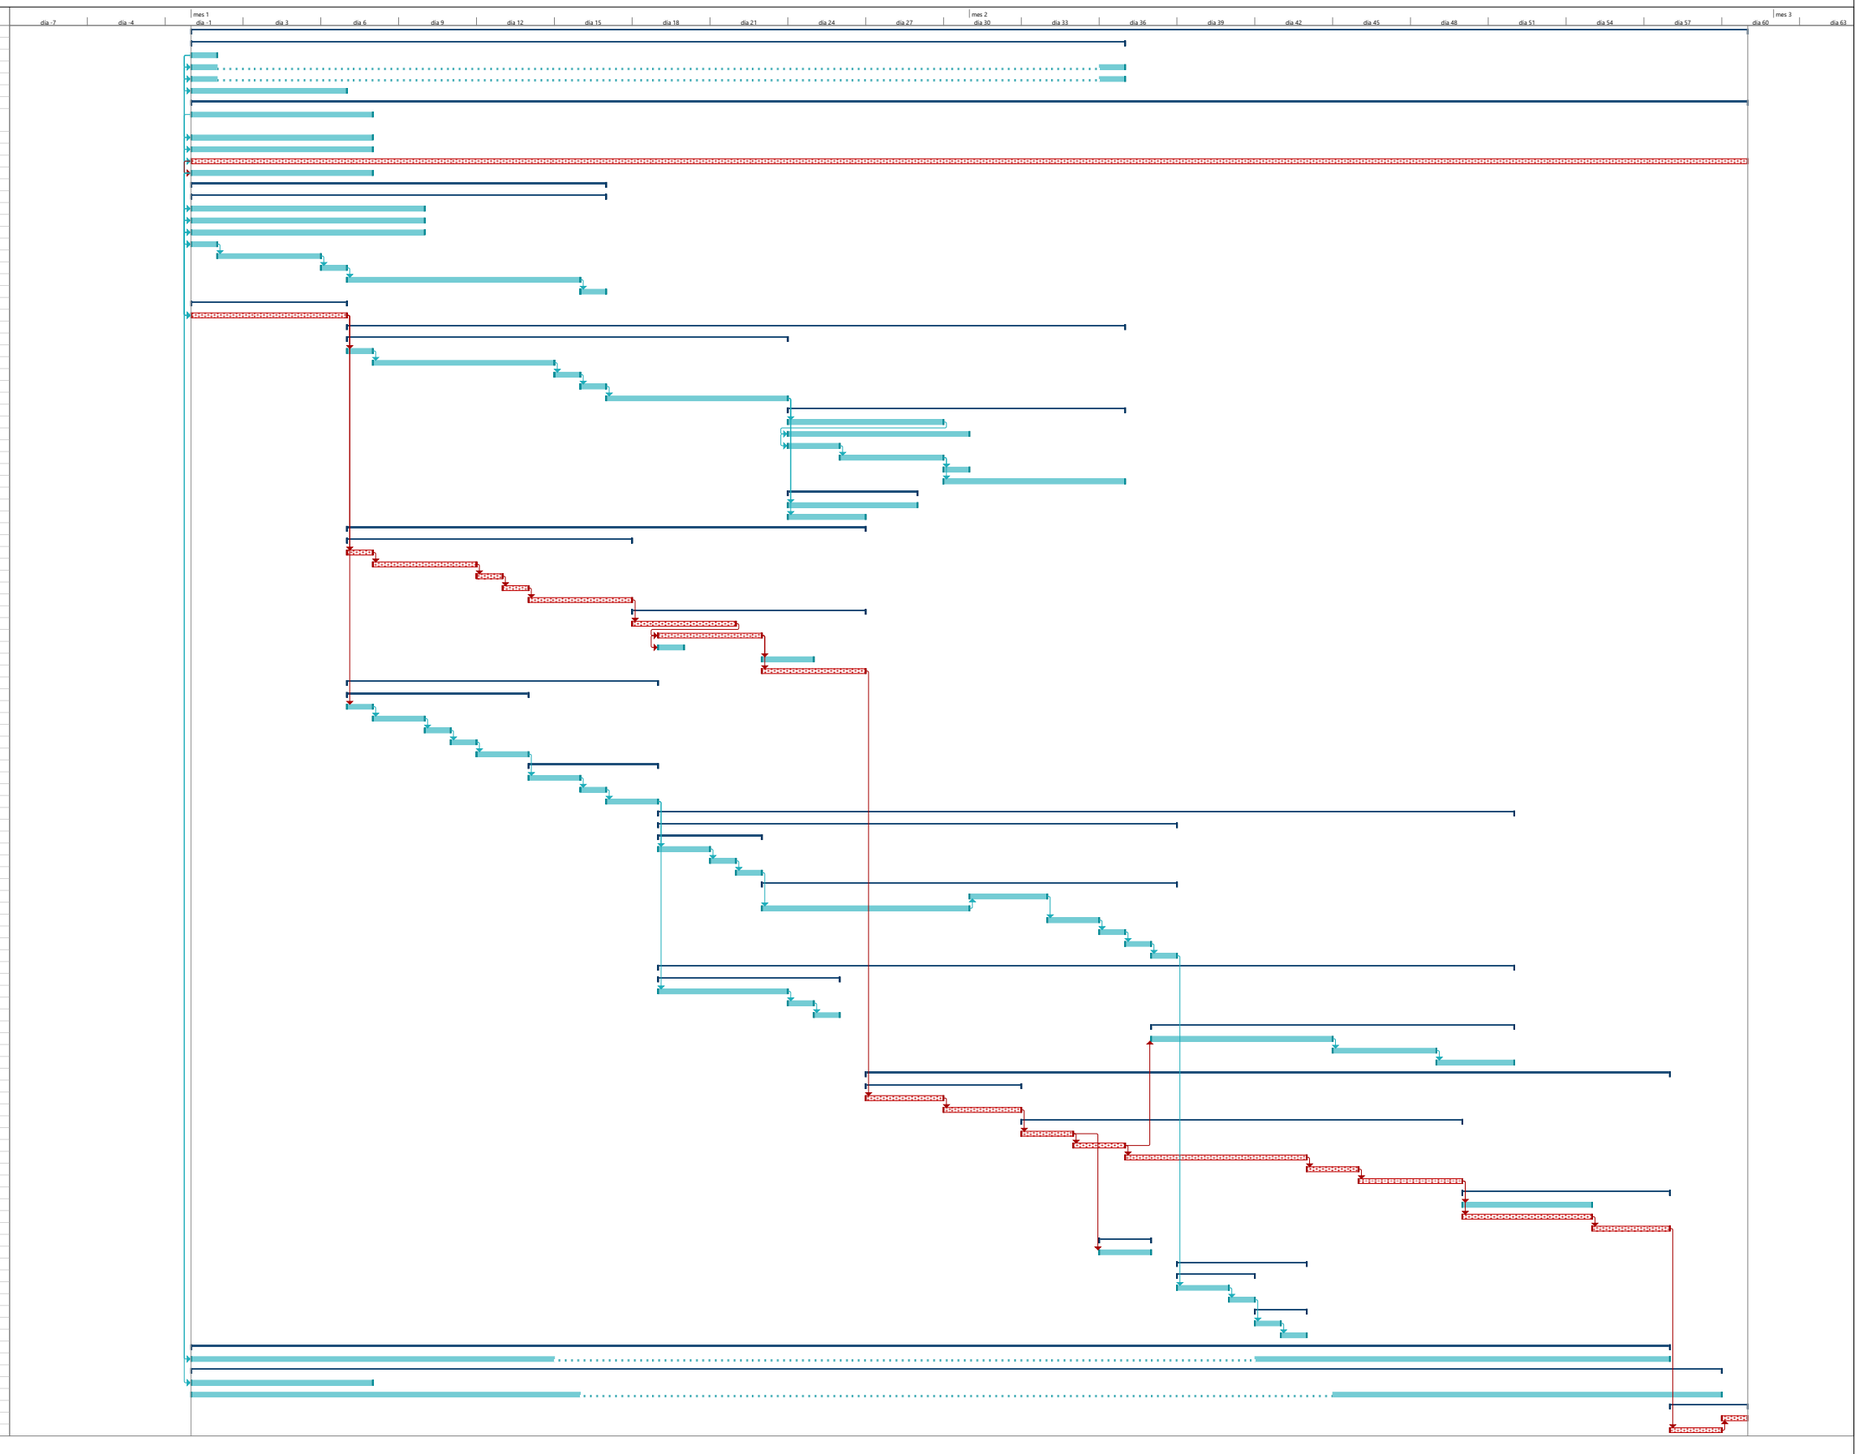

Proyecto: PISTA RIMAC
Fecha: mié 25/03/26

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | División crítica | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Tareas críticas | Progreso
